

Dec 05, 11 16:13

readme.txt

Page 1/2

Informationen zum Raumzeitdiagramm vom 2011-11-22:

=====EDMS: D*2604011=====

==Was ist neu?==

Hinzugekommen (seit Anfang Oktober) sind:

1. Monat verschiebung wegen Vermessungsarbeiten am Anfang.
2. Komptettierung der Wasserrohre + Druckluft im Einzelnen.
3. Durchbrueche im Mittensteg der Bodenplattenschale
4. (es gibt auch eine english Version, da wir das im MAC vorstellen wollen).
5. Neuarrangements der Kabel und Rohre
6. Neuverzahnunf der 30 Grad Wasserrohrarbeiten und LWL-Kabel
7. Deckenrahmenkonsolen (jetzt Anfang L3 und Anfang L2 frueh fertig)

Offen ist noch:

1. Vermessung moechte evtl weitere 3 Wochen am Anfang haben
2. Cryo-DN300 hab ich noch keine Angaben.
3. Zeitangabe zur Erdungsschiene ist nur geschaezt.
4. Installation der Rauchdetektoren fehlt
5. Installation der Wasserfvorhaenge fehlt
6. Erste sehr vorlaeufige Version der Maschineninstallationszeit, also Seiten zwei und drei.
7. Durch neue Entscheidung Ã¼ber Bodenplattenhandling entpannt sich die Lage vorraussichtlich beim Rausfahren der Bodenplatten. Dies ist noch nicht abgebildet.

==Aenderungen gegenueber dem Plan vom 2011-11-03==

* Nur Wasserrohrhalterinstallation rechts beginnt nun schon frueher und wird teilweise mithilfe einer Arbeitsplattform Ã¼ber dem offenen Boden rechts fortgesetzt. Die Dauer wurde mangels besserer Infor erstmal von mir geschaezt.

==Fazit==

Die erste Seite Beschreibt die TGA-Phase, hier ist der Plan schon soweit gut ausgearbeitet und abgestimmt, so dass wir ihn als Grundlage fÃ¼r die anstehenden Ausschreibungen und Bestellungen machen kÃ¶nnen. Die Version vom 2011-11-03 wurde offiziell dem MAC praesentiert.

Beachten Sie bitte, dass es beim Bodenplattenhandling kuerzlich eine Entscheidung gegeben hat, welche Einfluiss auf den Plan (im Bereich Juni- Sept 2012) haben wird. Dieses ist so noch nicht eingepflegt. Die Termine ab Sept 2012 verschoben sich aber voraussichtlich nicht. Hierzu gibt es weitere Plaene von Iris Gehrman (MEA).

Beachten Sie auÃerdem, dass einige in meinen AUgen unkritische Details nocht in diesen Plan aufgenommen wurden, nichtsdestotrotz natuerlich von den WPs (hauptsachlich MKK, IT) genauer geplant werden.

Die beiden anderen Seiten (zur Maschineninstallation) sind noch sehr ungenau und hier wird es noch ErgÃnzungen und Ãnderungen geben. Bitte deshalb auf diese Informationen noch keine kostspieligen Entscheidungen fussen. Thematisch gehoert hierzu: Modulreihenfolge und Sortierung, Aufbau der Warmen Strecken, Technisches Commissioning. Rackabschirmung und Girder ist noch nicht endgueltig designt.


mfg

Markus Hoffmann

Verweise auf andere Informationen:

=====

- * EDMS: D*2603771 Memo ueber die Reihenfolge der Cryomodul-Installation
- * EDMS: D*2603711 Memo ueber die Bodenplattenrangierungen im XTL

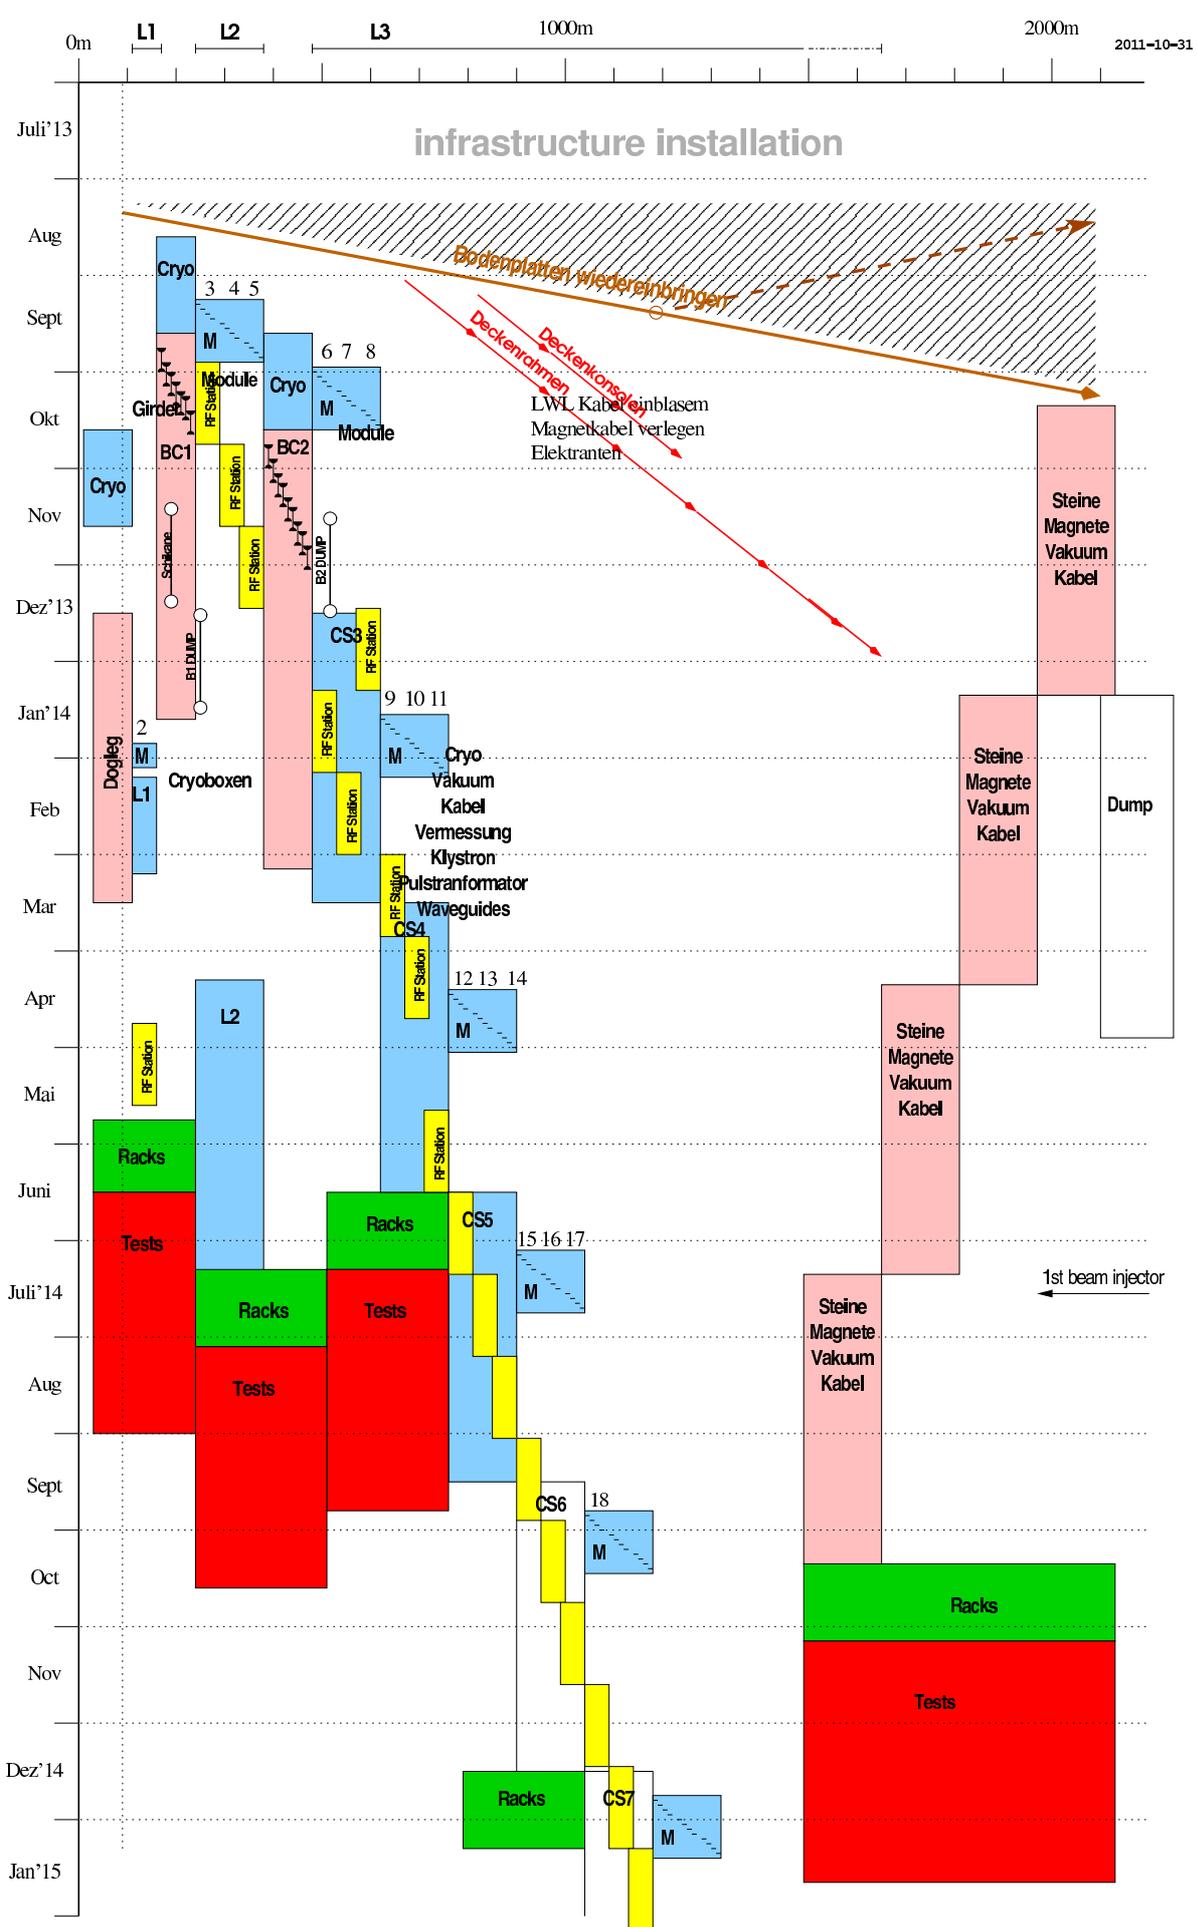

© HUGATROX management consulting

