Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	Guntest	21 Tage	Mo 25.11.13	Mo 23.12.13
2	**Installationen1**	**253 Tage**	**Do 02.01.14**	**Mo 22.12.14**
3	Kühlwasserdemontage f. Cryo	7 Tage	Do 02.01.14	Fr 10.01.14
4	Cryoinstallation	2 Monate	Mo 13.01.14	Fr 07.03.14
5	Cryoinstallation-Ventilboxen	2 Wochen	Mo 14.04.14	Fr 25.04.14
6	Dump vergiessen	4 Tage	Mi 23.04.14	Mo 28.04.14
7	Dump Installation	3 Tage	Mo 12.05.14	Mi 14.05.14
8	Aufbau Laufgang	2 Wochen	Mo 19.05.14	Fr 30.05.14
9	Lieferung Poller	1 Woche	Mi 21.05.14	Di 27.05.14
10	Pollereinbau XTIN	1 Woche	Mi 28.05.14	Di 03.06.14
11	Aufbau Guntisch	2 Wochen	Mo 21.04.14	Fr 02.05.14
12	Einbau Guntisch XTIN	1 Woche	Mo 05.05.14	Fr 09.05.14
13	Verkabelung Guntisch	3 Wochen	Mo 12.05.14	Fr 30.05.14
14	Einbau Laserbeamline	4 Wochen	Mo 26.05.14	Fr 20.06.14
15	Lieferung Girder	6 Wochen	Mo 17.03.14	Fr 25.04.14
16	Vormontage Girder (Halle 1)	8 Wochen	Mo 17.03.14	Fr 09.05.14
17	Girder Reinraummont.	3 Wochen	Mo 19.05.14	Fr 06.06.14
18	Endmontage Girder (Halle1)	3 Wochen	Mo 26.05.14	Fr 13.06.14
19	Girderinstallation XTIN	2 Wochen	Mo 09.06.14	Fr 20.06.14
20	Vakuum Installation	2 Wochen	Mo 16.06.14	Fr 27.06.14
21	Verkabelung etc.	4 Wochen	Di 16.09.14	Mo 13.10.14
22	Interlockvorprüfung	2 Tage	Mo 16.06.14	Di 17.06.14
23	Interlockprüfung	1 Tag	Mo 23.06.14	Mo 23.06.14
24	Gun 4.3 Commissioning mit La	11 Wochen	Di 01.07.14	Mo 15.09.14
25	Umbau auf Gun 4.x	4 Wochen	Di 16.09.14	Mo 13.10.14
26	Gun 4.x Commissioning mit La	10 Wochen	Di 14.10.14	Mo 22.12.14
27	3.9GHz fertig	0 Tage	Mo 16.02.15	Mo 16.02.15
28	**Installationen2**	**15 Tage**	**Mo 09.02.15**	**Fr 27.02.15**
29	Installation kalte Module	2 Wochen	Mo 09.02.15	Fr 20.02.15
30	Installation LLRF	2 Wochen	Mo 16.02.15	Fr 27.02.15
31	Kaltfahren	1 Woche	Mo 23.03.15	Fr 27.03.15
32	Modulkommissioning	3 Wochen	Mo 30.03.15	Fr 17.04.15
33	Interlockprüfung	1 Woche	Mo 30.03.15	Fr 03.04.15
34	Injektorinbetriebnahme	9 Monate	Mo 06.04.15	Fr 11.12.15

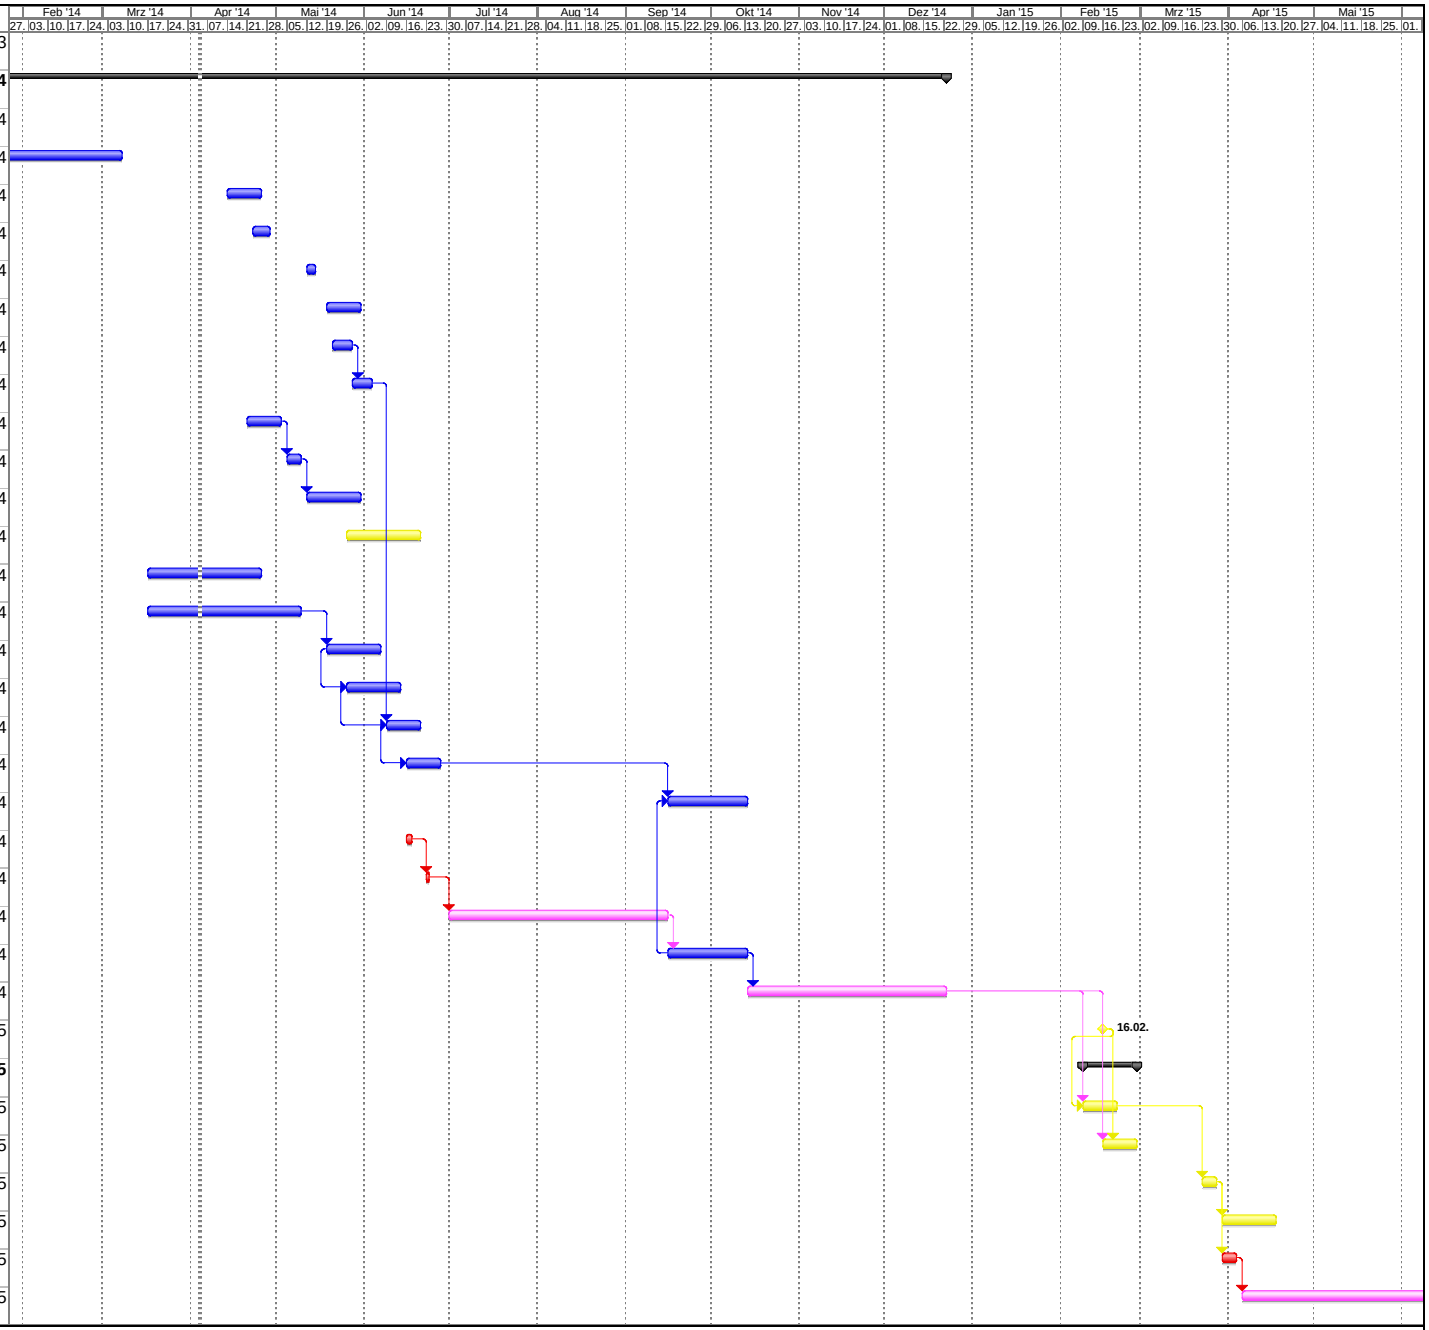

Projekt: InjektorUebersicht
Datum: Fr 04.04.14

Vorgang | In Arbeit | Sammelvorgang | Externe Vorgänge | Stichtag
Unterbrechung | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Externer Meilenstein
